



报告编号： JSly-JC-2020-10-016

资质证号： 2102019034 (乙级)



防雷(静电)装置检测报告

(2020 年度)

受检单位名称： 临沂市金耐动力机械有限公司

受检单位地址： 临沂市兰山区白沙埠镇朱潘社区西北 1000 米

本次检测日期： 2020 年 10 月 06 日

检测有效期： 2021 年 10 月 05 日

江苏雷远防雷检测有限公司

说 明 事 项

一、有下列行为之一者，本报告无效：

- 1、无检测单位章、侧翼无骑缝章。
- 2、无“检测人、校核人、签发人”签名。
- 3、部分复印本报告未重新加盖检测单位章。
- 4、涂改或缺页。

二、本报告仅对被检测点负责。

三、受检单位若对本报告有异议，须在收到本报告 15 天内提出，逾期即为认可。

四、检测周期是：防雷（静电）装置每年检测一次，易燃易爆场所的防雷（静电）装置每半年检测一次。检测周期的起始日期以出具检测报告日期为准，检测周期到期时，受检单位应主动及时申报检测，确保防雷（静电）装置性能有效。

五、标识标注说明：

(1) 本报告期内页中“/”表示无此项目；

(2) “—”表示应该有此项目，但无技术指标要求或不予判定。

(3) 表示材质时，“Fe”表示铁（钢），“Cu”表示铜，“AL”表示铝；

(4) 表示规格时，“S”表示截面，“Φ”表示直径，“R”表示半径，“T”表示厚度，“W”表示宽度，“L”表示长度，“H”表示高度；

(5) 表示方位时，“E、S、W、N”表示东、南、西、北；

(6) 除明确标注外，接地电阻值均为工频接地电阻值。

六、受检单位应贯彻“安全第一，预防为主，防治结合”的方针，加强对防雷（静电）装置的日常维护管理，指定专人负责，建立专门档案，以备查验。

七、检测单位：江苏雷远防雷检测有限公司

公司地址：江苏省徐州市贾汪区徐矿路众创空间产业园办公楼 314 室

公司业务电话：17662490007 13869969931

山东办事处联系电话：0539-8464119

检测规范和标准

本次检测	规范与标准
√	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431—2015
√	《建筑物防雷设计规范》GB50057—2010
	《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601—2010
	《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343—2012
√	《防雷装置检测服务规范》GB/T32938
	《防止静电事故通用导则》GB12158—2006
	《汽车加油加气站设计和施工规范》GB50156—2012
	《石油化工装置防雷设计规范》GB50650—2011
	《石油与石油设施雷电安全规范》GB15599—2009
	《石油化工静电接地设计规范》SH3097—2011
	《大型浮顶油罐防雷装置检测规范》QX/T311—2015
	《爆炸和火灾危险环境防雷装置检测技术规范》QX/T110—2009
	《煤化工装置防雷设计规范》QX/T310—2015
	《城镇燃气防雷技术规范》QX/T109—2009
	《太阳能光伏系统防雷技术规范》QX/T263—2015
	《光伏电站防雷技术要求标准》GB/T32512—2016
	《智能建筑防雷设计规范》QX/T331—2016
	《城市景观照设施防雷技术规范》QX/T210—2013
	《旅游景区雷电灾害防御技术规范》QX/T264—2015
	《建筑施工现场雷电安全技术规范》QX/T264—2014
	《高速公路设施防雷装置检测技术规范》QX/T211—2013
	《索道工程防雷技术规范》QX/T225—2013
	《地面气象观测场（室）防雷技术规范》GB/T31162—2014
	《地基 GPS 接收站防雷技术规范》QX/T161—2012
	《风廓线雷达站防雷技术规范》QX/T162—2012
	《桥梁防雷技术规范》GB/T31067—2014
	《大型桥梁防雷技术规范》QX/T330—2016
	《文物建筑防雷技术规范》QX189—2013
	《风力发电机组防雷装置检测技术规范》QX/T312—2015
	《安全防范系统雷电防护要求及检测技术规范》QX/T186—2013
	《计算机场地通用规范》GB/T2887—2011
	《电子信息系统机房设计规范》GB50174—2008
	《通信局（站）防雷与接地工程验收规范》GB51120—2015
	《输氧管道系统防雷装置检测技术规范》QX/T265—2015

检测仪器设备

本次检测	仪器名称	型号	编号	检定状况
√	激光测距仪	SW-150	JSLY-SB-01	周期内
	测厚仪	GM100	JSLY-SB-02	周期内
	经纬仪	DJD2-J	JSLY-SB-03	周期内
√	指针式拉力计	NK-500	JSLY-SB-04	周期内
	可燃气体测试仪	BH-90	JSLY-SB-05	周期内
√	接地电阻测试仪	SG3000	JSLY-SB-07	周期内
	土壤电阻率测试仪	SG3010E	JSLY-SB-08	周期内
√	等电位测试仪	SG3050	JSLY-SB-09	周期内
√	环路电阻测试仪	SG3020B+	JSLY-SB-010	周期内
	防雷元件测试仪	SHSG9200A	JSLY-SB-011	周期内
	绝缘电阻测试仪	VC60B+	JSLY-SB-012	周期内
	表面阻抗测试仪	GM3110	JSLY-SB-013	周期内
	静电电位测试仪	EST101	JSLY-SB-014	周期内
	数字万用表	UT39A+	JSLY-SB-015	周期内
	标准电阻	RX-70	JSLY-SB-016	周期内
√	钢卷尺	普通	JSLY-SB-017	周期内
√	游标卡尺	普通	JSLY-SB-018	周期内
√	对讲机	普通	JSLY-SB-019	周期内

防雷(静电)装置检测报告

基本信息汇总表

报告编号: JSLY-JC-2020-10-016


单位名称	临沂市金耐动力机械有限公司			
单位地址	临沂市兰山区白沙埠镇朱潘社区西北 1000 米			
行政区域	临沂市兰山区			
建筑物类别	三类	联系电话	15615996626	
检测属性	<input type="checkbox"/> 首检 <input checked="" type="checkbox"/> 年检	联系人	王经理	
检测周期	<input checked="" type="checkbox"/> 一年 <input type="checkbox"/> 半年	经度	118 ° 22'	
检测方法	GB/T21431-2015	纬度	35° 11'	
报告构成	<input checked="" type="checkbox"/> (A) 直击雷防护装置 <input checked="" type="checkbox"/> (B) 屏蔽、等电位及接地(过渡)电阻值 <input type="checkbox"/> (C) 电气系统电涌保护器 (SPD) <input type="checkbox"/> (D) 信号/天馈电涌保护器 (SPD) <input type="checkbox"/> (E) 电子系统			
检测结论	经现场勘查和检测, 该项目受检建(构)筑物本次所检接地电阻符合《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T21431-2015)技术规范要求。			
整改意见	无			
建议及备注	1、做好防雷装置维护工作以及定期检测, 确保防雷设施的有效性和安全性。 2、增加符合要求的防雷电涌保护器, 确保建筑用电安全。			
项目组成员	职责分工	姓名	证书编号/职称	本人签字
	检验员	刘永生	H1807315171	
		刘涛	H1807316170	
	校核人	刘勇	H1807315157/中级	
签发人	刘波	JSFLJC16080017/高级		

雷远防雷检测有限公司(盖章)

2020年10月08日

防雷装置检测报告

报告编号: JSLY-JC-2020-10-016

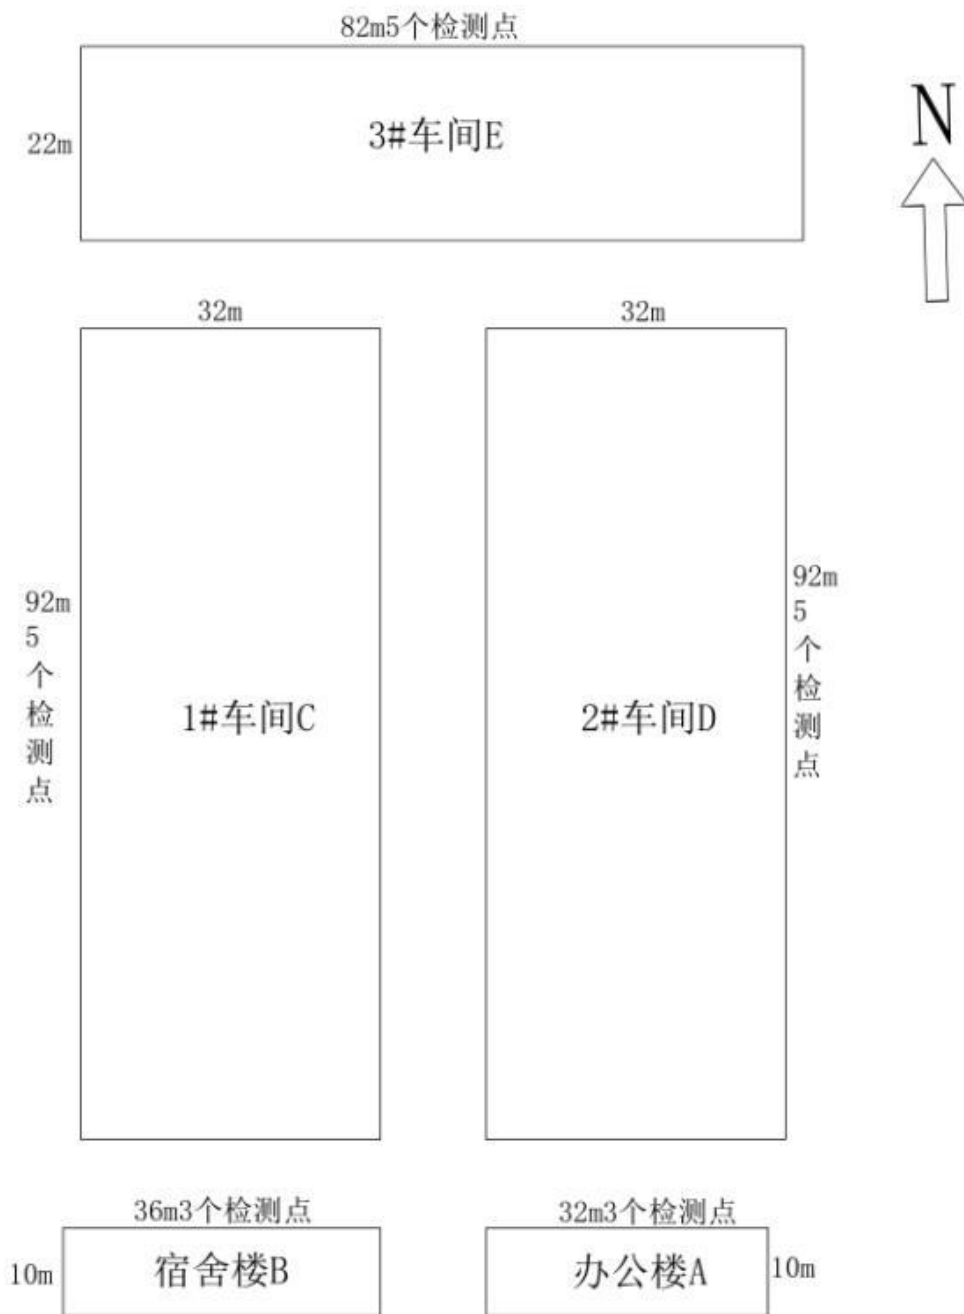

↙ 引下线 □ 建筑物 ● 检测点 ※ 辅助检测点

防雷(静电)装置检测报告

(A) 防直击雷

报告编号: JSLY-JC-2020-10-016

被保护物名称	办公楼 A	长/宽/高(m)	32.0/10.0/10.0	防雷类别	三类
检测项目		标准要求		检测记录	单项评定
接 闪 器	形式	接闪杆/接闪带/网/线/金属构件/金属屋面		接闪带	合格
	敷设方式	明敷/暗敷		暗敷	合格
	高度(m)	带(网)支起 $H \geq 0.15$		/	合格
	支架间距(m)	带明敷: 圆钢 ≤ 1.0 、扁钢 ≤ 0.5		/	合格
	规格材质(mm/mm ²)	(见GB/T21431-2015第5.2.2.5条)		自身/ $\Phi 8$ /Fe	合格
	网格尺寸(m)	一类: $\leq 5 \times 5$ 或 6×4 二类: $\leq 10 \times 10$ 或 12×8 三类: $\leq 20 \times 20$ 或 24×16		/	/
	腐蚀程度	明敷: 腐蚀 $\leq 1/3$ 原规格		未见腐蚀	合格
	固定状况	规范		牢固	合格
	焊接长度	圆钢间 $L \geq 6D$ (双面); 扁钢间 $L \geq 2W$ (三面)		/	/
	保护范围	按滚球法确定		达标	合格
引 下 线	敷设方式	明敷、暗敷		暗敷	合格
	数量(根)	≥ 2 (建筑物)		/	/
	间距(m)	一类 ≤ 12 ; 二类 ≤ 18 ; 三类 ≤ 25		/	/
	规格材质(mm/mm ²)	明敷: 圆钢 $D \geq 8$; 扁钢 $S \geq 50$ 暗敷: 圆钢 $D \geq 10$; 扁钢 $S \geq 80$ 烟囱: 圆钢 $D \geq 12$; 扁钢 $S \geq 100$		/	/
	明敷支架间距(m)	圆钢 ≤ 1.0 、扁钢 ≤ 0.5		/	/
	固定状况	固定可靠、无倒伏		可靠	/
	焊接长度	(同接闪器焊接长度)		达标	/
腐蚀程度	明敷: 腐蚀 $\leq 1/3$ 原规格		暗敷	/	
接 地 线	规格材质(mm/mm ²)	(同引下线规格材质)		20 mm	/
	腐蚀程度	明敷: 腐蚀 $\leq 1/3$ 原规格		暗敷	/
检测结论: 经检测, 以上各项均符合 GB/T21431-2015 的规定。				检测专用章	
整改要求: 无					
检测人: 刘永生 刘涛		校核人: 刘勇		检测日期: 2020年10月06日	

防雷(静电)装置检测报告

(B) 屏蔽、等电位及接地(过渡)电阻值

报告编号: JSLY-JC-2020-10-016

被保护物名称		办公楼 A				
检测项目			标准要求		检测记录	单项评定
序号	检测点		属性	规格/材质 (mm/mm ²)	电阻值 (Ω)	单项评定
	编号	名称				
1	A1#	引下线	防雷接地	本身/Fe	1.02	合格
2	A2#	引下线	防雷接地	本身/Fe	1.02	合格
3	A3#	引下线	防雷接地	本身/Fe	1.02	合格
4	A4#	引下线	防雷接地	本身/Fe	1.02	合格
5	A5#	引下线	防雷接地	本身/Fe	1.02	合格
6	A6#	引下线	防雷接地	本身/Fe	1.02	合格
7		以下空白				
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
检测结论: 经检测, 以上各项均符合 GB/T21431-2015 的规定。				检测专用章		
整改要求: 无						
备注	注: 接地系统接地电阻按设计要求, 三类≤30 Ω, 电气设备≤4 Ω, 含信息系统建筑物≤1 Ω。三类过防雷装置过渡电阻≤10 Ω。电气装置与接地网共用系统过渡电阻≤1 Ω					

防雷(静电)装置检测报告

(A) 防直击雷

报告编号: JSLY-JC-2020-10-016

被保护物名称	宿舍楼 B	长/宽/高(m)	36.0/10.0/10.0	防雷类别	三类
检测项目		标准要求		检测记录	单项评定
接 闪 器	形式	接闪杆/接闪带/网/线/金属构件/金属屋面		接闪带	合格
	敷设方式	明敷/暗敷		暗敷	合格
	高度(m)	带(网)支起 $H \geq 0.15$		/	合格
	支架间距(m)	带明敷: 圆钢 ≤ 1.0 、扁钢 ≤ 0.5		/	合格
	规格材质(mm/mm ²)	(见GB/T21431-2015第5.2.2.5条)		自身/ $\Phi 8$ /Fe	合格
	网格尺寸(m)	一类: $\leq 5 \times 5$ 或 6×4 二类: $\leq 10 \times 10$ 或 12×8 三类: $\leq 20 \times 20$ 或 24×16		/	/
	腐蚀程度	明敷: 腐蚀 $\leq 1/3$ 原规格		未见腐蚀	合格
	固定状况	规范		牢固	合格
	焊接长度	圆钢间 $L \geq 6D$ (双面); 扁钢间 $L \geq 2W$ (三面)		/	/
	保护范围	按滚球法确定		达标	合格
引 下 线	敷设方式	明敷、暗敷		暗敷	合格
	数量(根)	≥ 2 (建筑物)		/	/
	间距(m)	一类 ≤ 12 ; 二类 ≤ 18 ; 三类 ≤ 25		/	/
	规格材质(mm/mm ²)	明敷: 圆钢 $D \geq 8$; 扁钢 $S \geq 50$ 暗敷: 圆钢 $D \geq 10$; 扁钢 $S \geq 80$ 烟囱: 圆钢 $D \geq 12$; 扁钢 $S \geq 100$		/	/
	明敷支架间距(m)	圆钢 ≤ 1.0 、扁钢 ≤ 0.5		/	/
	固定状况	固定可靠、无倒伏		可靠	/
	焊接长度	(同接闪器焊接长度)		达标	/
	腐蚀程度	明敷: 腐蚀 $\leq 1/3$ 原规格		暗敷	/
接 地 线	规格材质(mm/mm ²)	(同引下线规格材质)		20 mm	/
	腐蚀程度	明敷: 腐蚀 $\leq 1/3$ 原规格		暗敷	/
检测结论: 经检测, 以上各项均符合 GB/T21431-2015 的规定。				检测专用章	
整改要求: 无					
检测人: 刘永生 刘涛		校核人: 刘勇		检测日期: 2020年10月06日	

防雷(静电)装置检测报告

(B) 屏蔽、等电位及接地(过渡)电阻值

报告编号: JSLY-JC-2020-10-016

被保护物名称		宿舍楼 B				
检测项目			标准要求		检测记录	单项评定
序号	检测点		属性	规格/材质 (mm/mm ²)	电阻值 (Ω)	单项评定
	编号	名称				
1	B1#	引下线	防雷接地	本身/Fe	1.12	合格
2	B2#	引下线	防雷接地	本身/Fe	1.12	合格
3	B3#	引下线	防雷接地	本身/Fe	1.12	合格
4	B4#	引下线	防雷接地	本身/Fe	1.12	合格
5	B5#	引下线	防雷接地	本身/Fe	1.12	合格
6	B6#	引下线	防雷接地	本身/Fe	1.12	合格
7		以下空白				
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
检测结论: 经检测, 以上各项均符合 GB/T21431-2015 的规定。				检测专用章		
整改要求: 无						
备注	注: 接地系统接地电阻按设计要求, 三类≤30Ω, 电气设备≤4Ω, 含信息系统建筑物≤1Ω。三类过防雷装置过渡电阻≤10Ω。电气装置与接地网共用系统过渡电阻≤1Ω					

防雷(静电)装置检测报告

(A) 防直击雷

报告编号: JSLY-JC-2020-10-016

被保护物名称	1#车间 C	长/宽/高(m)	92.0/32.0/7.5	防雷类别	三类
检测项目		标准要求		检测记录	单项评定
接 闪 器	形式	接闪杆/接闪带/网/线/金属构件/金属屋面		金属屋面	合格
	敷设方式	明敷/暗敷		明敷	合格
	高度(m)	带(网)支起H≥0.15		/	合格
	支架间距(m)	带明敷: 圆钢≤1.0、扁钢≤0.5		/	合格
	规格材质(mm/mm ²)	(见GB/T21431-2015第5.2.2.5条)		自身 /1 mm /Fe	合格
	网格尺寸(m)	一类: ≤5×5 或 6×4 二类: ≤10×10 或 12×8 三类: ≤20×20 或 24×16		/	/
	腐蚀程度	明敷: 腐蚀≤1/3原规格		未见腐蚀	合格
	固定状况	规范		牢固	合格
	焊接长度	圆钢间L≥6D(双面);扁钢间L≥2W(三面)		/	/
	保护范围	按滚球法确定		达标	合格
引 下 线	敷设方式	明敷、暗敷		暗敷	合格
	数量(根)	≥2(建筑物)		/	/
	间距(m)	一类≤12; 二类≤18; 三类≤25		/	/
	规格材质(mm/mm ²)	明敷: 圆钢 D≥8; 扁钢 S≥50 暗敷: 圆钢 D≥10; 扁钢 S≥80 烟囱: 圆钢 D≥12; 扁钢 S≥100		/	/
	明敷支架间距(m)	圆钢≤1.0、扁钢≤0.5		/	/
	固定状况	固定可靠、无倒伏		可靠	/
	焊接长度	(同接闪器焊接长度)		达标	/
腐蚀程度	明敷: 腐蚀≤1/3 原规格		暗敷	/	
接 地 线	规格材质(mm/mm ²)	(同引下线规格材质)		20 mm	/
	腐蚀程度	明敷: 腐蚀≤1/3 原规格		暗敷	/
检测结论: 经检测, 以上各项均符合 GB/T21431-2015 的规定。				检测专用章	
整改要求: 无					
检测人: 刘永生 刘涛		校核人: 刘勇		检测日期: 2020年10月06日	

防雷(静电)装置检测报告

(B) 屏蔽、等电位及接地(过渡)电阻值

报告编号: JSLY-JC-2020-10-016

被保护物名称		1#车间 C				
检测项目			标准要求		检测记录	单项评定
序号	检测点		属性	规格/材质 (mm/mm ²)	电阻值 (Ω)	单项评定
	编号	名称				
1	C1#	棚接地	防雷接地	本身/Fe	0.75	合格
2	C2#	棚接地	防雷接地	本身/Fe	0.75	合格
3	C3#	棚接地	防雷接地	本身/Fe	0.75	合格
4	C4#	棚接地	防雷接地	本身/Fe	0.75	合格
5	C5#	棚接地	防雷接地	本身/Fe	0.75	合格
6	C6#	棚接地	防雷接地	本身/Fe	0.75	合格
7	C7#	棚接地	防雷接地	本身/Fe	0.75	合格
8	C8#	棚接地	防雷接地	本身/Fe	0.75	合格
9	C9#	棚接地	防雷接地	本身/Fe	0.75	合格
10	C10#	棚接地	防雷接地	本身/Fe	0.75	合格
11	C11#	棚接地	防雷接地	本身/Fe	0.75	合格
12	C12#	棚接地	防雷接地	本身/Fe	0.75	合格
13		以下空白				
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
检测结论: 经检测, 以上各项均符合 GB/T21431-2015 的规定。				检测专用章		
整改要求: 无						
备注	注: 接地系统接地电阻按设计要求, 三类≤30Ω, 电气设备≤4Ω, 含信息系统建筑物≤1Ω。三类过防雷装置渡电阻≤10Ω。电气装置与接地网共用系统过渡电阻≤1Ω					

防雷(静电)装置检测报告

(A) 防直击雷

报告编号: JSLY-JC-2020-10-016

被保护物名称	2#车间 D	长/宽/高(m)	92.0/32.0/7.5	防雷类别	三类
检测项目		标准要求		检测记录	单项评定
接 闪 器	形式	接闪杆/接闪带/网/线/金属构件/金属屋面		金属屋面	合格
	敷设方式	明敷/暗敷		明敷	合格
	高度(m)	带(网)支起H≥0.15		/	合格
	支架间距(m)	带明敷: 圆钢≤1.0、扁钢≤0.5		/	合格
	规格材质(mm/mm ²)	(见GB/T21431-2015第5.2.2.5条)		自身 /1 mm /Fe	合格
	网格尺寸(m)	一类: ≤5×5 或 6×4 二类: ≤10×10 或 12×8 三类: ≤20×20 或 24×16		/	/
	腐蚀程度	明敷: 腐蚀≤1/3原规格		未见腐蚀	合格
	固定状况	规范		牢固	合格
	焊接长度	圆钢间L≥6D(双面);扁钢间L≥2W(三面)		/	/
	保护范围	按滚球法确定		达标	合格
引 下 线	敷设方式	明敷、暗敷		暗敷	合格
	数量(根)	≥2(建筑物)		/	/
	间距(m)	一类≤12; 二类≤18; 三类≤25		/	/
	规格材质(mm/mm ²)	明敷: 圆钢 D≥8; 扁钢 S≥50 暗敷: 圆钢 D≥10; 扁钢 S≥80 烟囱: 圆钢 D≥12; 扁钢 S≥100		/	/
	明敷支架间距(m)	圆钢≤1.0、扁钢≤0.5		/	/
	固定状况	固定可靠、无倒伏		可靠	/
	焊接长度	(同接闪器焊接长度)		达标	/
腐蚀程度	明敷: 腐蚀≤1/3 原规格		暗敷	/	
接 地 线	规格材质(mm/mm ²)	(同引下线规格材质)		20 mm	/
	腐蚀程度	明敷: 腐蚀≤1/3 原规格		暗敷	/
检测结论: 经检测, 以上各项均符合 GB/T21431-2015 的规定。				检测专用章	
整改要求: 无					
检测人: 刘永生 刘涛		校核人: 刘勇		检测日期: 2020年10月06日	

防雷(静电)装置检测报告

(B) 屏蔽、等电位及接地(过渡)电阻值

报告编号: JSLY-JC-2020-10-016

被保护物名称		2#车间 D				
检测项目			标准要求		检测记录	单项评定
序号	检测点		属性	规格/材质 (mm/mm ²)	电阻值 (Ω)	单项评定
	编号	名称				
1	D1#	棚接地	防雷接地	本身/Fe	0.71	合格
2	D2#	棚接地	防雷接地	本身/Fe	0.71	合格
3	D3#	棚接地	防雷接地	本身/Fe	0.71	合格
4	D4#	棚接地	防雷接地	本身/Fe	0.71	合格
5	D5#	棚接地	防雷接地	本身/Fe	0.71	合格
6	D6#	棚接地	防雷接地	本身/Fe	0.71	合格
7	D7#	棚接地	防雷接地	本身/Fe	0.71	合格
8	D8#	棚接地	防雷接地	本身/Fe	0.71	合格
9	D9#	棚接地	防雷接地	本身/Fe	0.71	合格
10	D10#	棚接地	防雷接地	本身/Fe	0.71	合格
11	D11#	棚接地	防雷接地	本身/Fe	0.71	合格
12	D12#	棚接地	防雷接地	本身/Fe	0.71	合格
13		以下空白				
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
检测结论: 经检测, 以上各项均符合 GB/T21431-2015 的规定。				检测专用章		
整改要求: 无						
备注	注: 接地系统接地电阻按设计要求, 三类≤30Ω, 电气设备≤4Ω, 含信息系统建筑物≤1Ω。三类过防雷装置过渡电阻≤10Ω。电气装置与接地网共用系统过渡电阻≤1Ω					

防雷(静电)装置检测报告

(A) 防直击雷

报告编号: JSLY-JC-2020-10-016

被保护物名称	3#车间 E	长/宽/高(m)	82.0/22.0/8.5	防雷类别	三类
检测项目		标准要求		检测记录	单项评定
接 闪 器	形式	接闪杆/接闪带/网/线/金属构件/金属屋面		金属屋面	合格
	敷设方式	明敷/暗敷		明敷	合格
	高度(m)	带(网)支起H≥0.15		/	合格
	支架间距(m)	带明敷: 圆钢≤1.0、扁钢≤0.5		/	合格
	规格材质(mm/mm ²)	(见GB/T21431-2015第5.2.2.5条)		自身 /1 mm /Fe	合格
	网格尺寸(m)	一类: ≤5×5 或 6×4 二类: ≤10×10 或 12×8 三类: ≤20×20 或 24×16		/	/
	腐蚀程度	明敷: 腐蚀≤1/3原规格		未见腐蚀	合格
	固定状况	规范		牢固	合格
	焊接长度	圆钢间L≥6D(双面);扁钢间L≥2W(三面)		/	/
	保护范围	按滚球法确定		达标	合格
引 下 线	敷设方式	明敷、暗敷		暗敷	合格
	数量(根)	≥2(建筑物)		/	/
	间距(m)	一类≤12; 二类≤18; 三类≤25		/	/
	规格材质(mm/mm ²)	明敷: 圆钢 D≥8; 扁钢 S≥50 暗敷: 圆钢 D≥10; 扁钢 S≥80 烟囱: 圆钢 D≥12; 扁钢 S≥100		/	/
	明敷支架间距(m)	圆钢≤1.0、扁钢≤0.5		/	/
	固定状况	固定可靠、无倒伏		可靠	/
	焊接长度	(同接闪器焊接长度)		达标	/
	腐蚀程度	明敷: 腐蚀≤1/3 原规格		暗敷	/
接 地 线	规格材质(mm/mm ²)	(同引下线规格材质)		20 mm	/
	腐蚀程度	明敷: 腐蚀≤1/3 原规格		暗敷	/
检测结论: 经检测, 以上各项均符合 GB/T21431-2015 的规定。				检测专用章	
整改要求: 无					
检测人: 刘永生 刘涛		校核人: 刘勇		检测日期: 2020年10月06日	

防雷(静电)装置检测报告

(B) 屏蔽、等电位及接地（过渡）电阻值

报告编号：JSLY-JC-2020-10-016

被保护物名称		3#车间 E				
检测项目			标准要求		检测记录	单项 评定
序号	检测点		属性	规格/材质 (mm/mm ²)	电阻值 (Ω)	单项评定
	编号	名称				
1	E1#	棚接地	防雷接地	本身/Fe	1.36	合格
2	E2#	棚接地	防雷接地	本身/Fe	1.36	合格
3	E3#	棚接地	防雷接地	本身/Fe	1.36	合格
4	E4#	棚接地	防雷接地	本身/Fe	1.36	合格
5	E5#	棚接地	防雷接地	本身/Fe	1.36	合格
6	E6#	棚接地	防雷接地	本身/Fe	1.36	合格
7	E7#	棚接地	防雷接地	本身/Fe	1.36	合格
8	E8#	棚接地	防雷接地	本身/Fe	1.36	合格
9	E9#	棚接地	防雷接地	本身/Fe	1.36	合格
10	E10#	棚接地	防雷接地	本身/Fe	1.36	合格
11		以下空白				
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
检测结论：经检测，以上各项均符合 GB/T21431-2015 的规定。				检测专用章		
整改要求：无						
备注	注：接地系统接地电阻按设计要求，三类≤30Ω，电气设备≤4Ω，含信息系统建筑物≤1Ω。三类过防雷装置过渡电阻≤10Ω。电气装置与接地网共用系统过渡电阻≤1Ω					

以下空白
